RUTA CRITICA DEL PROYECTO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		**READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANTIGUO EDIFICIO EX SRI PARA USO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES**	**240 días**	**lun 2/10/23**
2		**INICIO**	**0 días**	**lun 2/10/23**
3		Limpieza de obra	56 días	lun 2/10/23
4		Lona de Protección Perimetral	56 días	lun 2/10/23
5		Trazado, Replanteo y nivelación para edificaciones	56 días	lun 2/10/23
6		Derrocamiento de paredes de mamposteria (incluye aluminio y vidrio, revestimientos, carpinteria, todas las instalaciones existentes y desalojo)	56 días	lun 2/10/23
7		Remocion de recubrimientos en piso y remoción de todo material existente sobre la losa de compresión (incluye desalojo)	56 días	lun 2/10/23
8		Desmontaje de estructuras de cubierta existente (incluye desalojo)	56 días	lun 2/10/23
9		Remocion de tumbado existente (incluye retiro de todas las instalaciones existentes: eléctricas, electrónicas, hidráulicas, sanitarias, climatización y desalojo)	56 días	lun 2/10/23
10		Rotura de Elementos de Hormigon Armado Tipo Columna o Muros (incluye apuntalamiento y desalojo)	56 días	lun 2/10/23
11		Rotura de Sistemas de Piso: losa, vigas (incluye apuntalamiento y desalojo)	56 días	lun 2/10/23
12		Hormigón f'c=280 kg/cm2 (elaborado en obra, incluye encofrado)	112 días	lun 27/11/23
13		Steel Deck placa 55 e=0.76mm, suministro e instalación	156 días	lun 25/12/23
14		Malla electrosoldada 5.5 20X20, suministro e instalación	156 días	lun 25/12/23
15		Acero estructural ASTM-36, suministro, fabricación e instalación	156 días	lun 25/12/23
16		Reforzamiento de elementos tipo Columnas (picado de elemento, limpieza, protección de armadura, encamisado con mortero estructural)	112 días	lun 27/11/23
17		Reforzamiento de elementos tipo Vigas (picado de elemento, limpieza, protección de armadura, encamisado con mortero estructural)	112 días	lun 27/11/23
18		Acero de refuerzo para reforzamiento de elementos estructurales, incluye epóxico de anclaje.	112 días	lun 27/11/23
19		UPS 10KVA MONOFASICO 220V	72 días	lun 18/3/24
20		Acometida 3F#2 15KV-TB4 DE 5N. TUBERIA 4" RIGIDA	156 días	lun 25/12/23
21		Equipo de expansion Directa; Tipo: Piso Techo; capacidad: 36.000 BTU/hr; Inverter	156 días	lun 25/12/23
22		Equipo de expansion Directa; Tipo:Consola de pared; capacidad: 12.000 BTU/hr; Inverter	156 días	lun 25/12/23
23		Ventilador de Extraccion; Tipo: Helico Centrifugo; Capacidad: 250	156 días	lun 25/12/23
24		Tuberia de Cobre Diam 1-1/8", incluye aislamiento termico y soportes	112 días	lun 27/11/23
25		Tuberia de Cobre Diam 7/8", incluye aislamiento termico y soportes	112 días	lun 27/11/23
26		Tuberia de Cobre Diam 5/8", incluye aislamiento termico y soportes	112 días	lun 27/11/23
27		Tuberia de Cobre Diam 3/8", incluye aislamiento termico y soportes	112 días	lun 27/11/23
28		Tuberia de Cobre Diam 1/4", incluye aislamiento termico y soportes	112 días	lun 27/11/23
29		Ducto de Tol Galvanizado Sin aislamiento Termico	112 días	lun 27/11/23
30		Ducto flexible Aislado, Diam 4"	112 días	lun 27/11/23
31		Rejilla de extraccion de 10"x10"	156 días	lun 25/12/23
32		Rejilla de Extraccion de 6"x6"	156 días	lun 25/12/23
33		Rejilla de Extraccion de 4"x4"	156 días	lun 25/12/23
34		Juego de 4 bases antivibratoria de goma comprimida de alta resistencia (para equipos hasta de 60.000	156 días	lun 25/12/23
35		Bases para unidad condensadora de descarga horizontal	156 días	lun 25/12/23
36		Cable de señal concentrico de 2x18 (INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR)	156 días	lun 25/12/23
37		Cable de señal concentrico de 4x12 (INTERCONEXION ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR EQUIPOS TIPO CONSOLA DE PARED)	156 días	lun 25/12/23
38		Cargas de Nitrogeno (cargas)	156 días	lun 25/12/23
39		Valvulas de carga	156 días	lun 25/12/23
40		Filtro deshidratador diam 3/8"	156 días	lun 25/12/23
41		FIN	0 días	mar 28/5/24

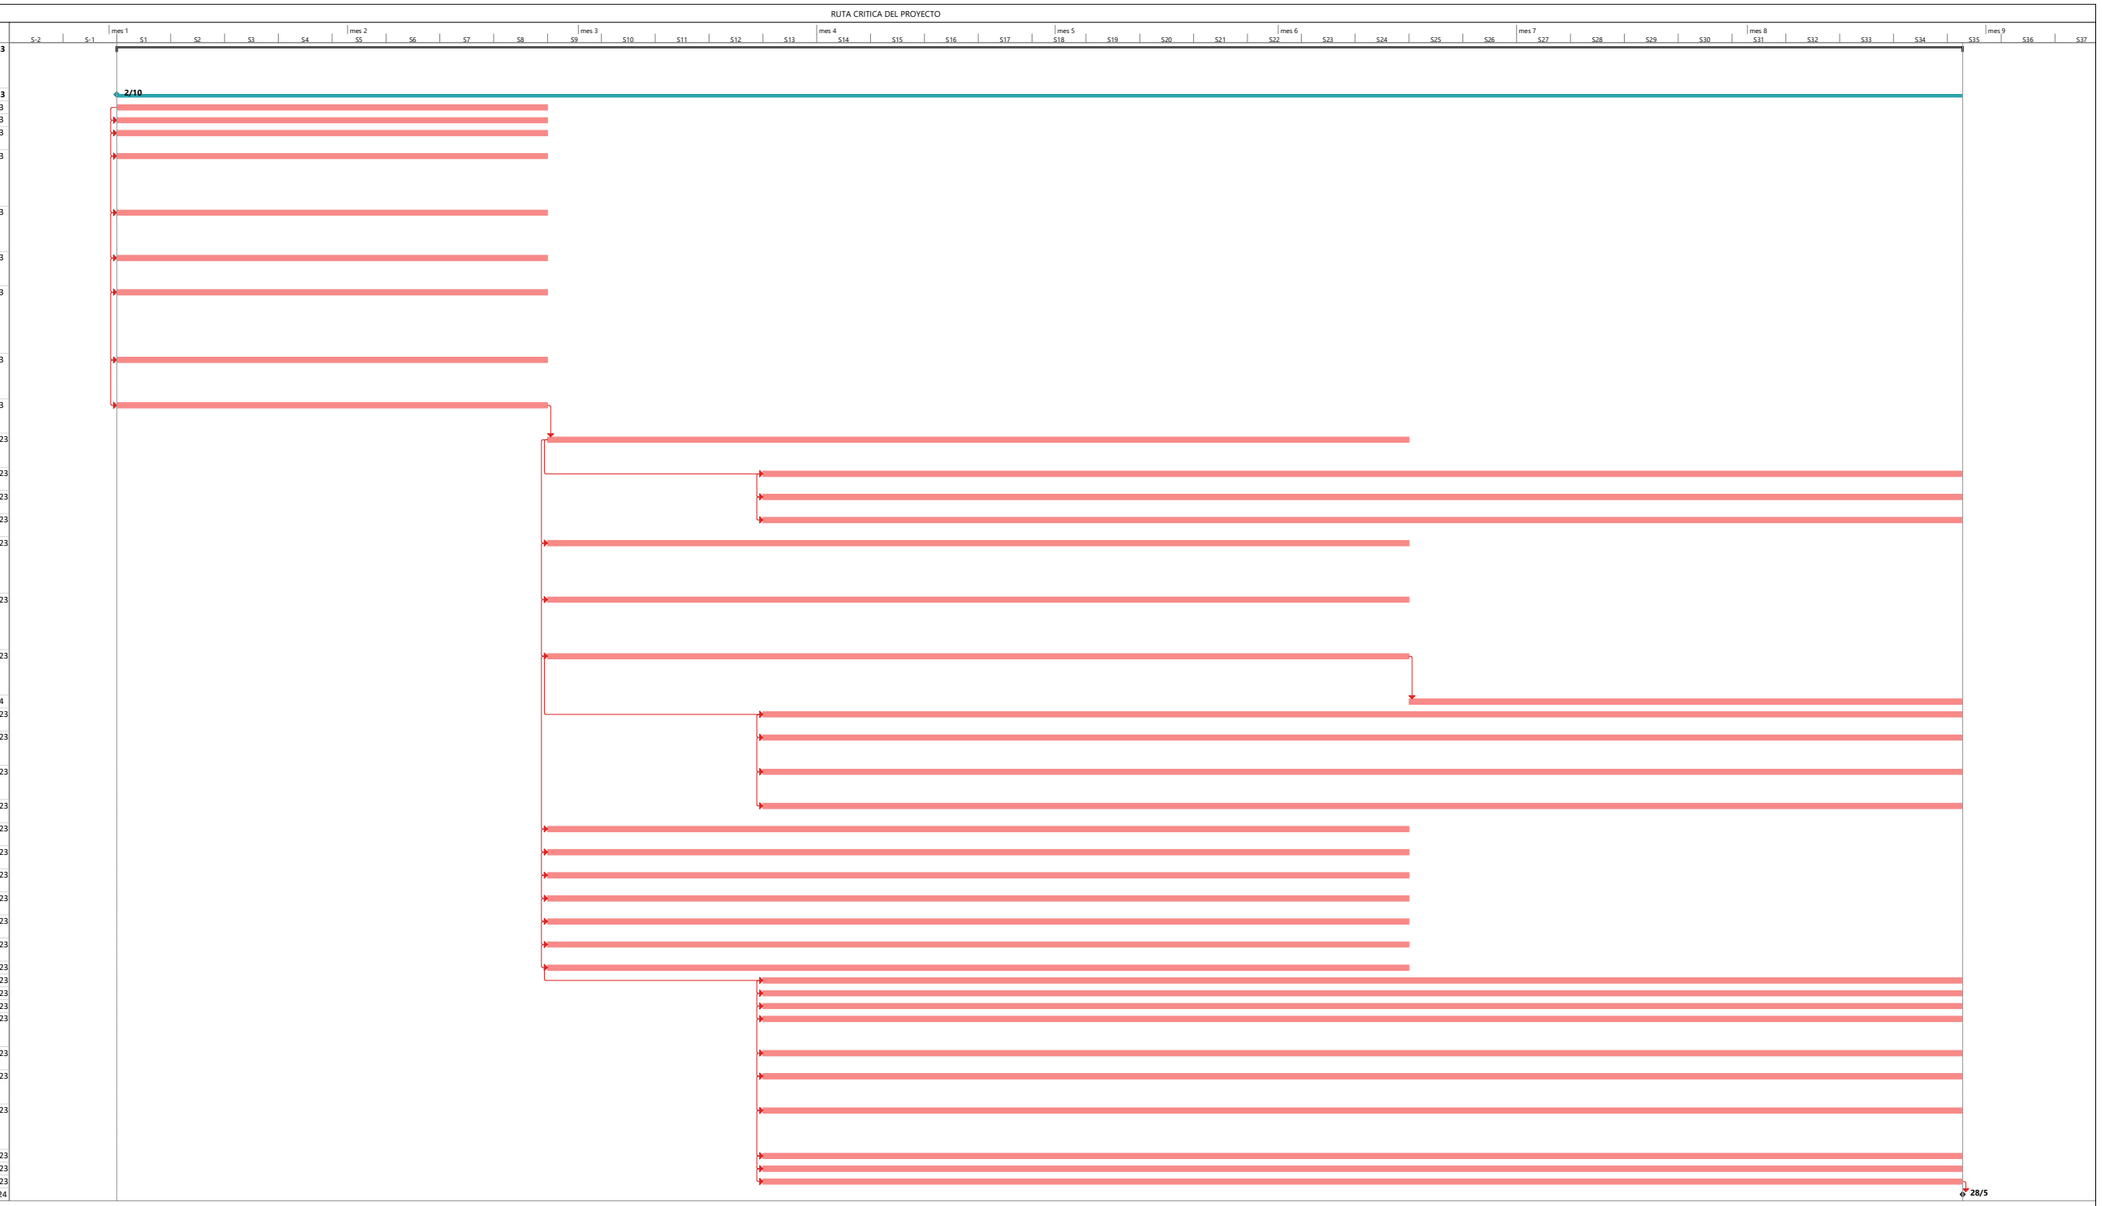

Firmado electrónicamente por:
BOLIVAR RAFAEL VENEGAS INTRIAGO

Proyecto: PROYECTO READECU
Fecha: lun 28/8/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
