

Id	Mc de tar	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo	2021 octubre 20					
									9	14	19	24	29	4
0			CRONOGRAMA VALORADO/DIAGRAMA DE GANTT-UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	210 días	jue 31/8/23	mié 19/6/24		\$ 116.990,00						
1			INICIO	0 días	jue 31/8/23	jue 31/8/23		\$ 0,00						
2			FASE A	210 días	jue 31/8/23	mié 19/6/24		\$ 116.990,00						
3			2.1 Suministro, fabricación e instalación de Ductos de Tol Galvanizado aislados con lana de vidrio	20 días	jue 31/8/23	mié 27/9/23		\$ 1.315,62						
4			2.2 Suministro, fabricación e instalación de Ductos de Tol Galvanizado aislados con lana de vidrio	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 5.920,31						
5			2.3 Desinstalación de Ductos de Tol Galvanizado aislados con lana de vidrio	20 días	jue 31/8/23	mié 27/9/23		\$ 1.039,49						
6			2.4 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 8"x8" con Çdámper	20 días	jue 31/8/23	mié 27/9/23		\$ 12,91						
7			2.5 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 8"x8" con Çdámper	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 58,13						
8			2.6 Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10"x10" con dámper	20 días	jue 31/8/23	mié 27/9/23		\$ 86,58						

Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Mc de tar	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo	2021 octubre 20					
										9	14	19	24	29	4
9			2.7	Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10"x10" con dámper	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 389,61						
10			2.8	Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10"x10" sin dámper	20 días	jue 31/8/23	mié 27/9/23		\$ 17,63						
11			2.9	Instalación Difusor de aire de 4 vías de 10"x10" sin dámper	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 79,32						
12			2.10	Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12"x12" con dámper	20 días	jue 31/8/23	mié 27/9/23		\$ 181,92						
13			2.11	Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12"x12" con dámper	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 818,63						
14			2.12	Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12"x12" sin dámper	20 días	jue 31/8/23	mié 27/9/23		\$ 50,49						
15			2.13	Instalación Difusor de aire de 4 vías de 12"x12" sin dámper	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 227,20						
16			2.14	Instalación Rejilla Retorno de aire de 10"x10"	20 días	jue 28/9/23	mié 25/10/23	14	\$ 8,22						
17			2.15	Instalación Rejilla Retorno de aire de 10"x10"	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 37,00						
18			2.16	Instalación Rejilla Retorno de aire de 10"x10"	20 días	jue 28/9/23	mié 25/10/23	14	\$ 12,22						

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Mc	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo	2021 octubre 20					
										9	14	19	24	29	4
19			2.1	Instalación Rejilla Retorno de aire de 10''x10''	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 54,97						
20			2.1	Instalación Rejilla Retorno de aire de 22''x22''	20 días	jue 28/9/23	mié 25/10/23	14	\$ 18,14						
21			2.1	Instalación Rejilla Retorno de aire de 22''x22''	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 81,64						
22			2.2	Instalación Rejilla Lineal 24"x4"	20 días	jue 28/9/23	mié 25/10/23	14	\$ 80,08						
23			2.2	Instalación Rejilla Lineal 24"x4"	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 360,35						
24			2.2	Desinstalación Difusor/Rejilla	20 días	jue 28/9/23	mié 25/10/23	14	\$ 262,41						
25			2.2	Ducto flexible aislado diámetro 6''	20 días	jue 28/9/23	mié 25/10/23	14	\$ 119,51						
26			2.2	Ducto flexible aislado diámetro 8''	20 días	jue 28/9/23	mié 25/10/23	14	\$ 435,81						
27			2.2	Ducto flexible aislado diámetro 10''	20 días	jue 28/9/23	mié 25/10/23	14	\$ 625,45						
28			2.2	Split Ducto, capacidad: 60000 BTU/H, inc	20 días	jue 26/10/23	mié 22/11/23	27	\$ 3.119,21						
29			2.2	Tubería de cobre diámetro 7/8"	20 días	jue 26/10/23	mié 22/11/23	27	\$ 116,74						
30			2.2	Tubería de cobre diámetro 3/8"	20 días	jue 26/10/23	mié 22/11/23	27	\$ 53,13						
31			2.2	Aislamiento para tubería de cobre diámetro 7/8"	20 días	jue 26/10/23	mié 22/11/23	27	\$ 17,38						
32			2.3	Instalación y programación de sistema de	20 días	jue 26/10/23	mié 22/11/23	27	\$ 30.143,99						
33			2.3	Termostato modulante para fancoil agua helada	20 días	jue 26/10/23	mié 22/11/23	27	\$ 6.844,33						

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Mc de tar	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo	2021					
									9	14	19	24	29	4
34		2.3.	Caja de Volumen Variable L-CVAV-8, incl	20 días	jue 26/10/23	mié 22/11/2 27		\$ 9.124,05						
35		2.3.	Caja de Volumen Variable L-CVAV-10, inc	20 días	jue 26/10/23	mié 22/11/2 27		\$ 25.305,14						
36		2.3.	Caja de Volumen Variable L-CVAV-12, inc	20 días	jue 23/11/23	mié 20/12/2 35		\$ 8.499,36						
37		2.3.	Caja de Volumen Variable L-CVAV-14, inc	20 días	jue 23/11/23	mié 20/12/2 35		\$ 2.907,10						
38		2.3.	Caja de Volumen Variable L-CVAV-16, inc	20 días	jue 23/11/23	mié 20/12/2 35		\$ 2.990,61						
39		2.3.	Cable 4x16 para conexión de termostatos	20 días	jue 23/11/23	mié 20/12/23	35	\$ 871,62						
40		2.3.	Cable 3x14 para punto eléctrico cajas VAV	20 días	jue 23/11/23	mié 20/12/23	35	\$ 362,01						
41		2.3.	Tapada de hueco de 24"x16" con gypsum	20 días	jue 23/11/23	mié 20/12/23	35	\$ 326,18						
42		2.4.	Tapada de hueco de 250 cm x 70 cm con gypsum	20 días	jue 23/11/23	mié 20/12/23	35	\$ 131,03						
43		2.4.	Boquete en pared de bloque 24"x10"	20 días	jue 23/11/23	mié 20/12/2 35		\$ 260,46						
44		2.4.	Puerta de aluminio de 65 cm x 240 cm	20 días	jue 21/12/23	mié 17/1/24	43	\$ 207,62						
45		2.4.	Sellado de junta de vidrio en mampara	20 días	jue 21/12/23	mié 17/1/24	43	\$ 71,10						
46		2.4.	Tapada de hueco de 24"x26" con gypsum	20 días	jue 21/12/23	mié 17/1/24	43	\$ 247,00						

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
Fecha: mié 30/8/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Mc de tar	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predec	Costo	2021					
									9	14	19	24	29	4
47		2.4	Tapada de hueco de 70 cm x 70 cm en pu	20 días	jue 21/12/23	mié 17/1/24	43	\$ 80,37						
48		2.4	Resanar tumbado en area acustica 100 cm x 100 cm	20 días	jue 21/12/23	mié 17/1/24	43	\$ 2.834,37						
49		2.4	Desmontaje de tumbado decorativo	20 días	jue 21/12/23	mié 17/1/24	43	\$ 85,47						
50		2.4	Sellar vidrio 210 cm x 70 cm	20 días	jue 21/12/23	mié 17/1/24	43	\$ 487,72						
51		2.4	Mantenimiento integral de UMA	10 días	jue 31/8/23	mié 13/9/23		\$ 329,36						
52		2.5	Mantenimiento integral de UMA	10 días	jue 23/11/23	mié 6/12/23	35	\$ 329,36						
53		2.5	Mantenimiento integral de UMA	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 2.964,21						
54		2.5	Mantenimiento integral de Fancoil	10 días	jue 31/8/23	mié 13/9/23		\$ 75,68						
55		2.5	Mantenimiento integral de Fancoil	10 días	jue 23/11/23	mié 6/12/23	35	\$ 75,68						
56		2.5	Mantenimiento integral de Fancoil	90 días	jue 15/2/24	mié 19/6/24		\$ 681,07						
57		2.5	Cambio de ventilador centrífugo en UMA	20 días	jue 18/1/24	mié 14/2/24	50	\$ 1.592,03						
58		2.5	Suministro y colocación de pintura en gypsum	20 días	jue 18/1/24	mié 14/2/24	50	\$ 1.975,98						
59		2.5	Resanar tumbado en area normal 100 cm x 100 cm	20 días	jue 18/1/24	mié 14/2/24	50	\$ 1.587,00						
60		3	FINAL	0 días	mié 19/6/24	mié 19/6/24		\$ 0,00						

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

octubre 2021 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | noviembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | diciembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | enero 2022 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | febrero 2022 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21



Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

octubre 2021 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | noviembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | diciembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | enero 2022 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | febrero 2022 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21



Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


octubre 2021 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | noviembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | diciembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | enero 2022 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | febrero 2022 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21



Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

octubre 2021 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | noviembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | diciembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | enero 2022 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | febrero 2022 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21



Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

octubre 2021 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | noviembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | diciembre 2021 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | enero 2022 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | febrero 2022 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21




Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 junio 2022 julio 2022

26 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 junio 2022 julio 2022

26 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 junio 2022 julio 2022

26 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 junio 2022 julio 2022

26 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 junio 2022 julio 2022

26 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

21 | 26 | agosto 2022 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2022 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | octubre 2022 | 29 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | noviembre 2022 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | diciembre 2022 | 28 | 3 | 8

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

21 | 26 | agosto 2022 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2022 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | octubre 2022 | 29 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | noviembre 2022 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | diciembre 2022 | 28 | 3 | 8

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

21 | 26 | agosto 2022 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2022 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | octubre 2022 | 29 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | noviembre 2022 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | diciembre 2022 | 28 | 3 | 8



Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

21 | 26 | agosto 2022 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2022 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | octubre 2022 | 29 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | noviembre 2022 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | diciembre 2022 | 28 | 3 | 8

Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

21 | 26 | agosto 2022 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2022 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | octubre 2022 | 29 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | noviembre 2022 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | diciembre 2022 | 28 | 3 | 8



Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

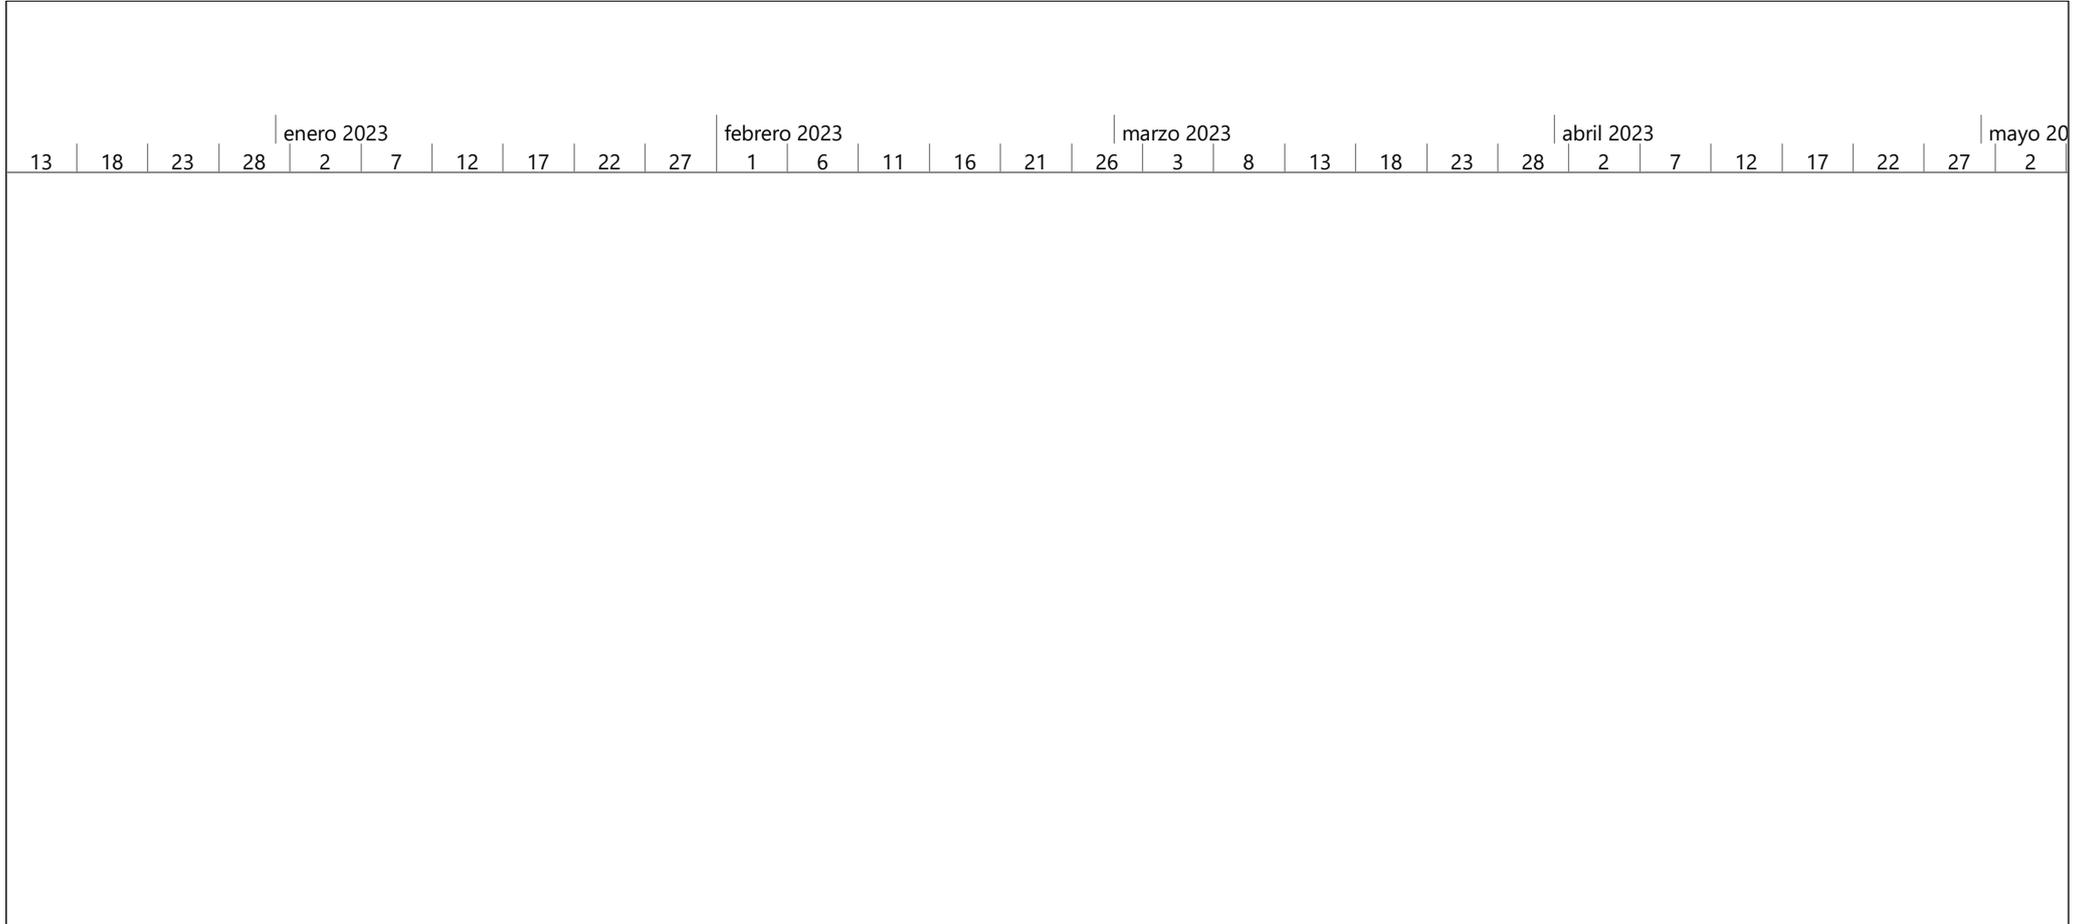


Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

13 | 18 | 23 | 28 | enero 2023 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | febrero 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | marzo 2023 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | abril 2023 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | mayo 2023 | 2


Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

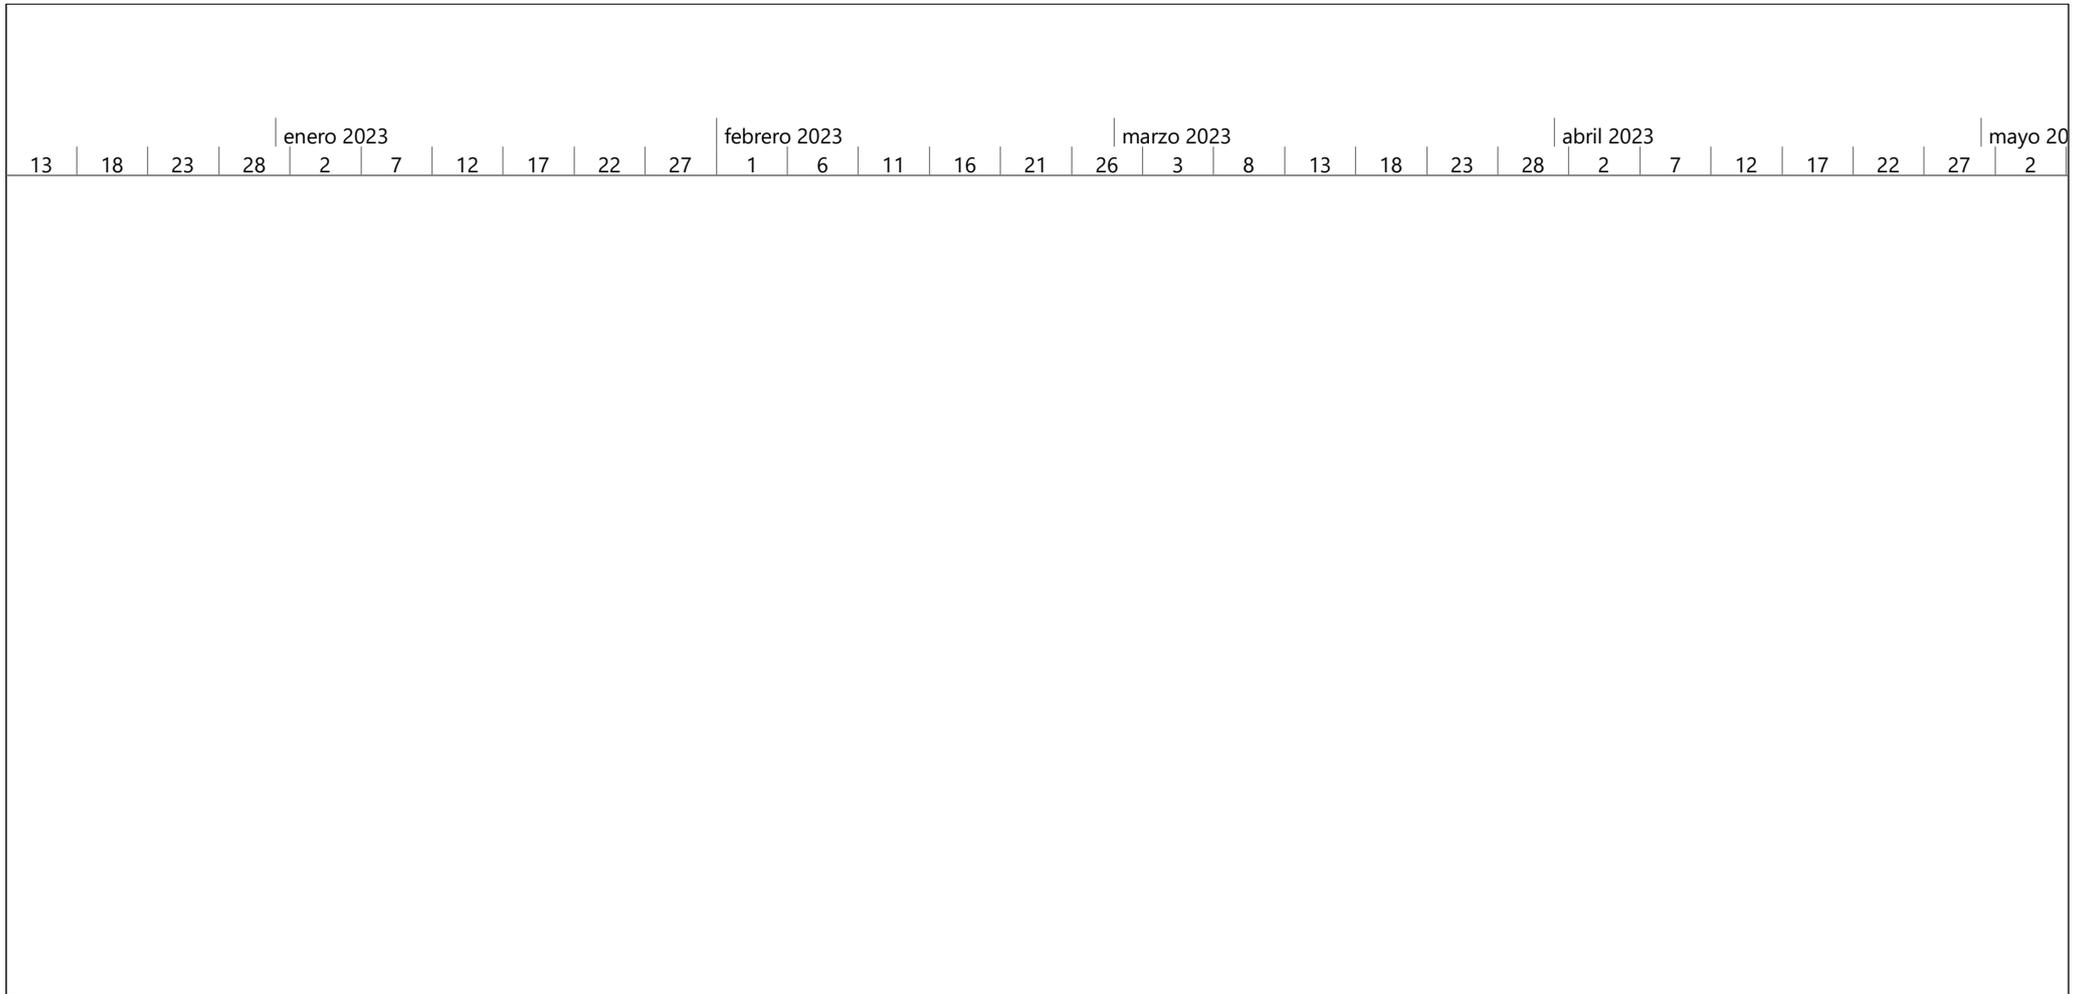

Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

23 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | junio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | julio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | agosto 2023 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2023 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24



Project: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

23 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | junio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | julio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | agosto 2023 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2023 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24



Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


23 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | junio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | julio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | agosto 2023 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2023 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24



Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

23 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | junio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | julio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | agosto 2023 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2023 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24




Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

23 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | junio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | julio 2023 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | agosto 2023 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | septiembre 2023 | 30 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24




Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

| octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | enero 2024 | febrero 2024
 29 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 1 | 6 | 11 | 16

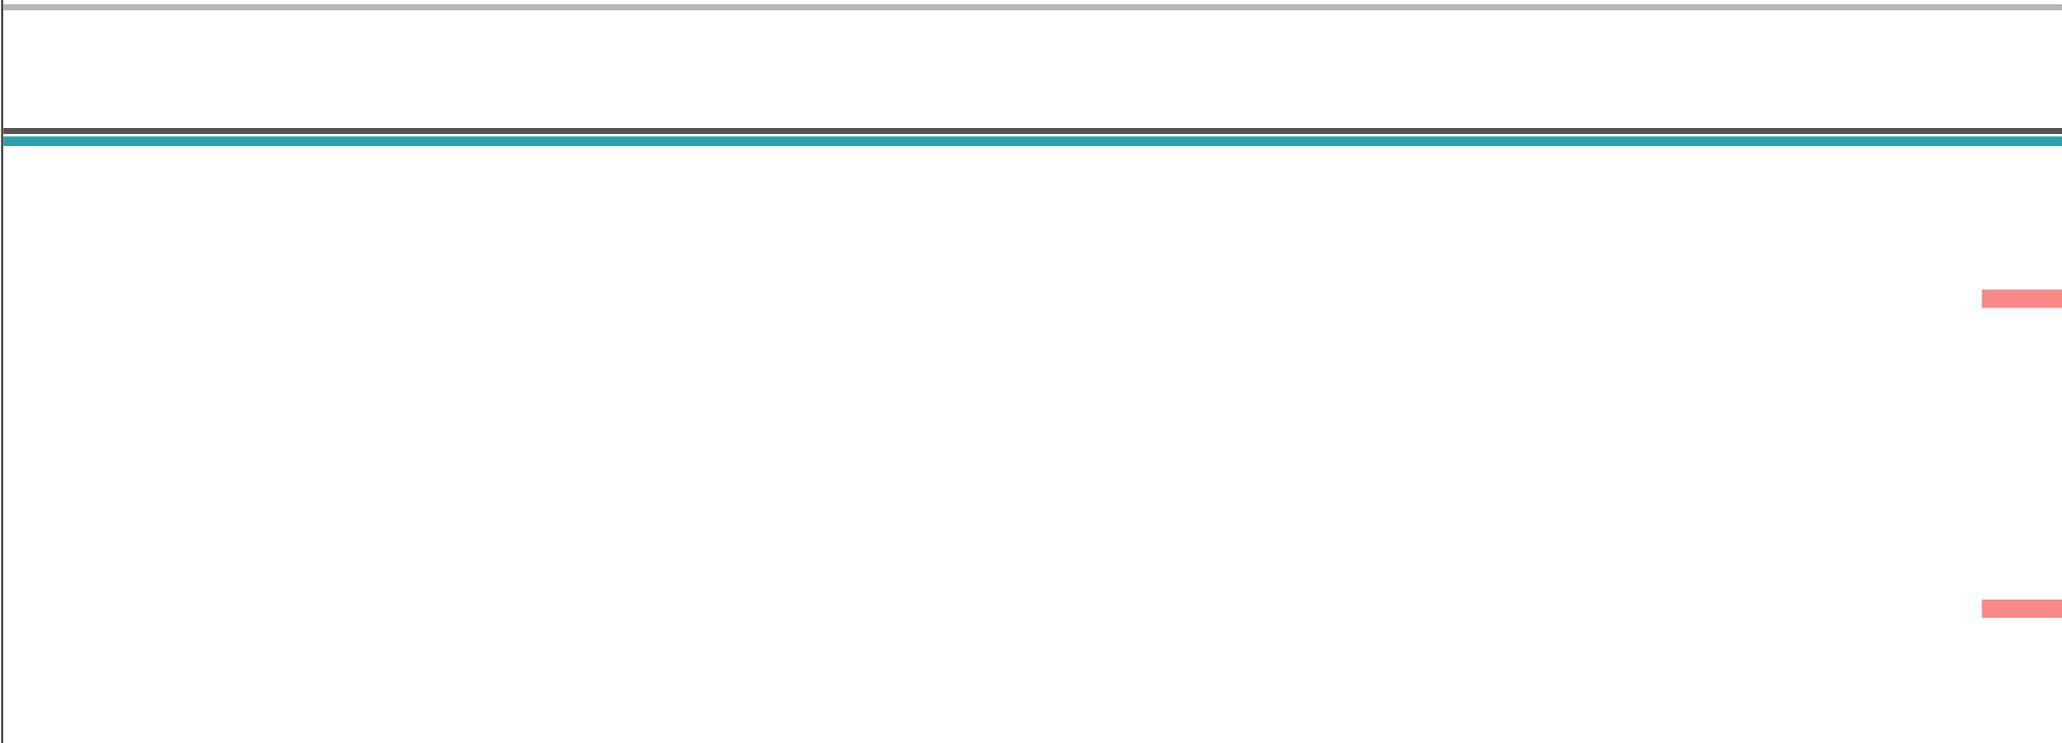


Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

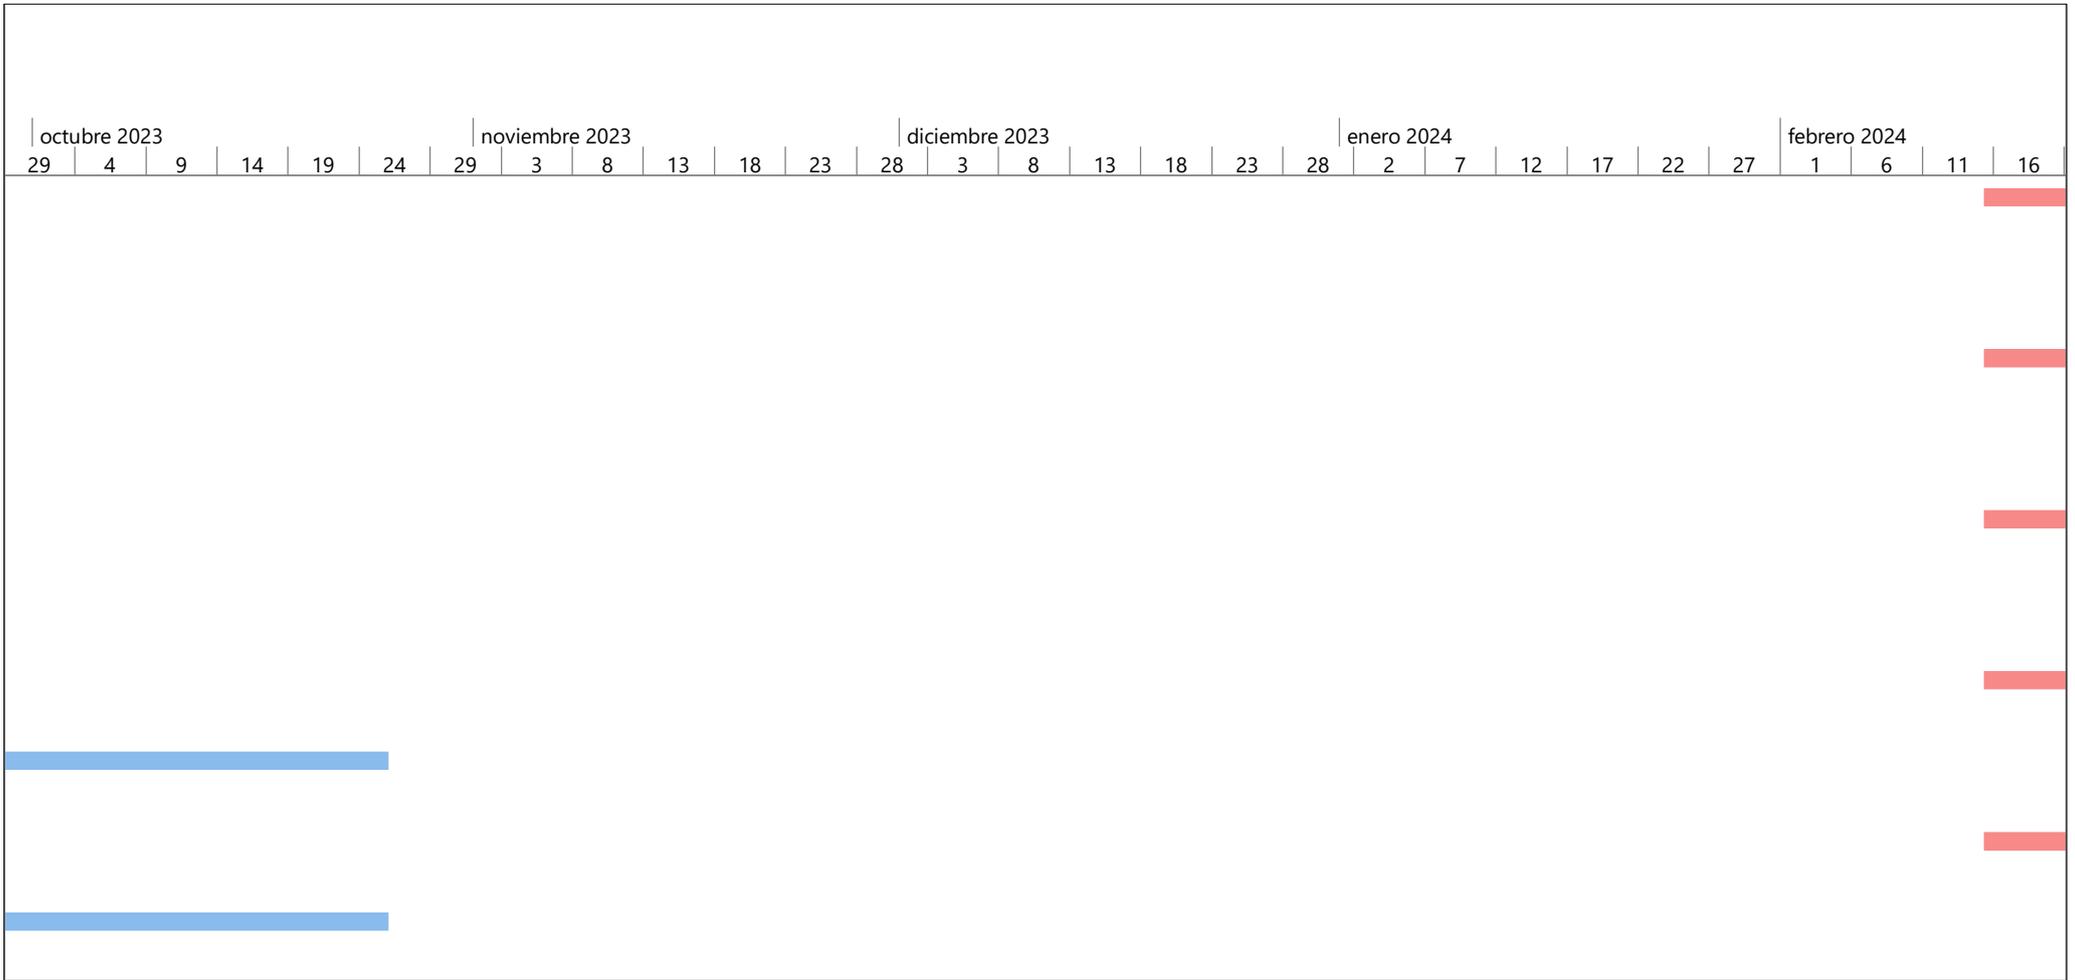


Proyecto: CRONOGRAMA VAL
 Fecha: mié 30/8/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

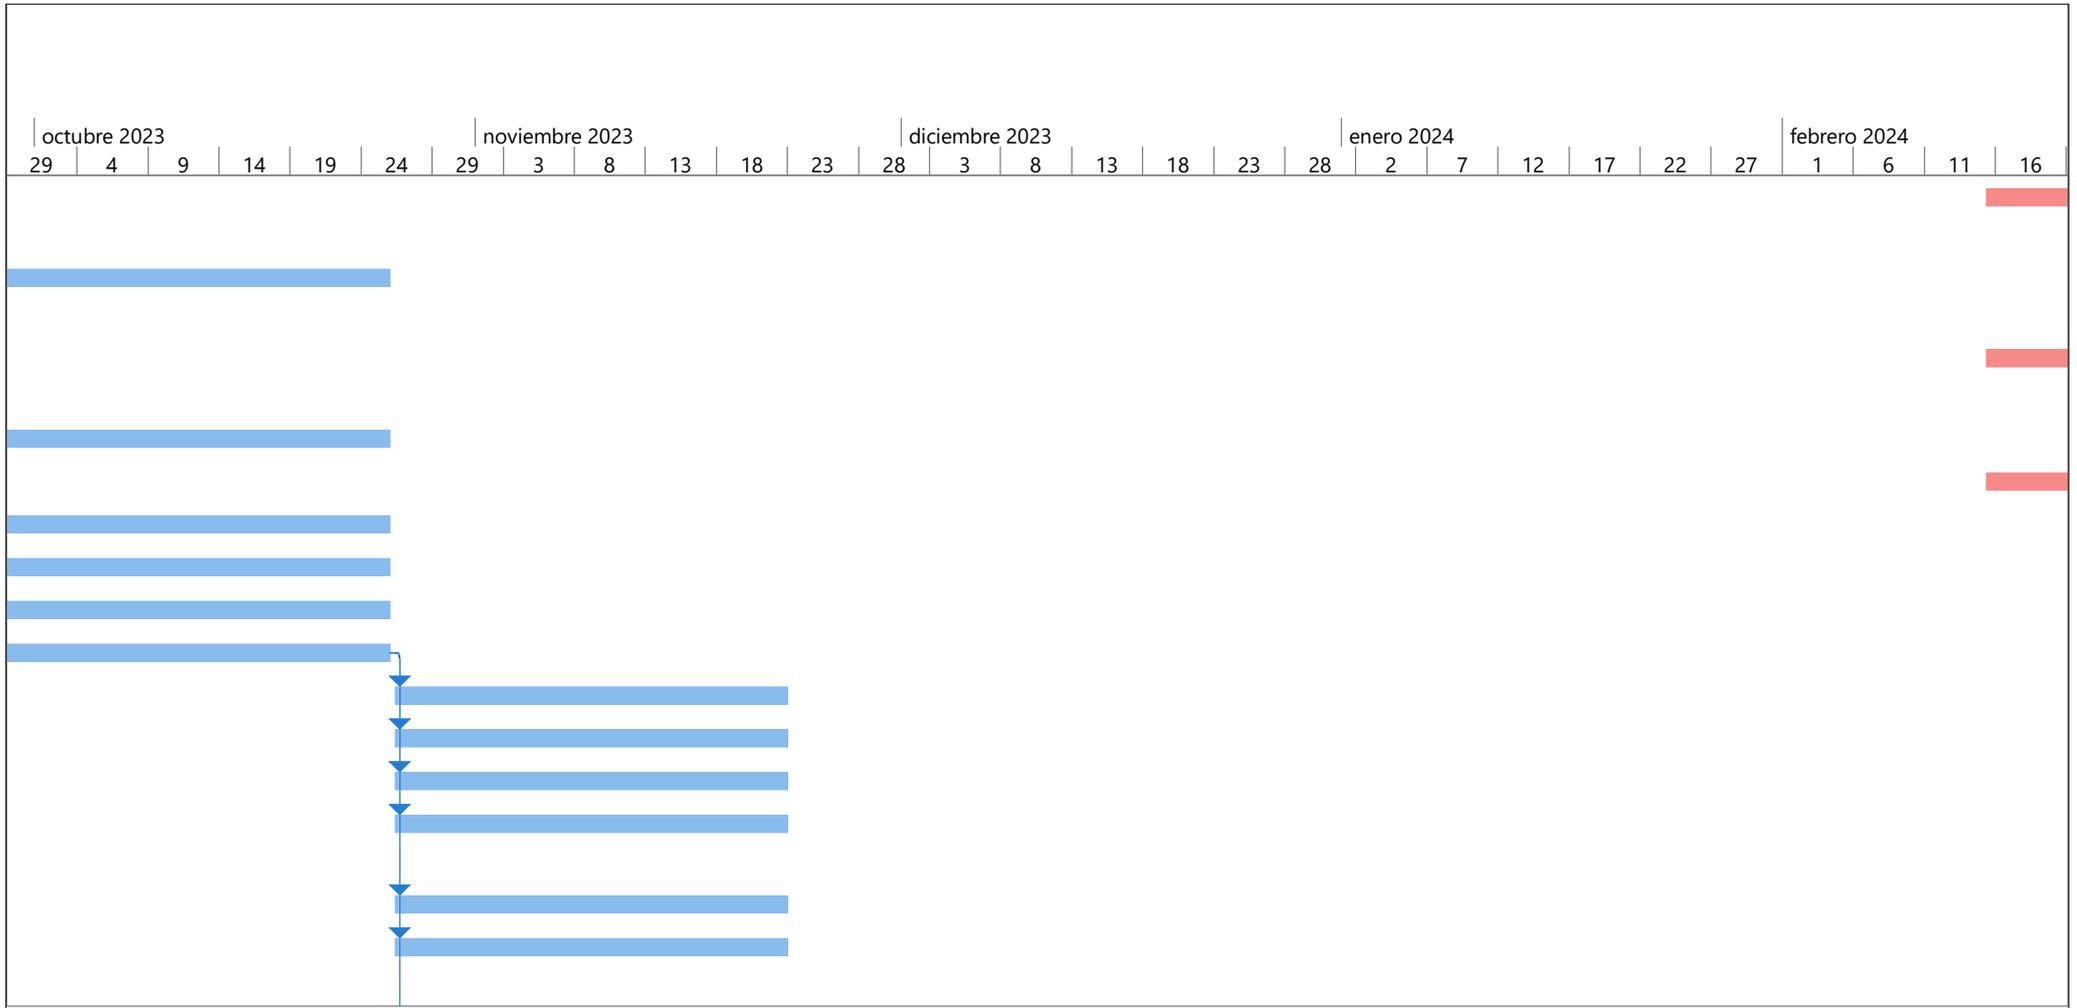


Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

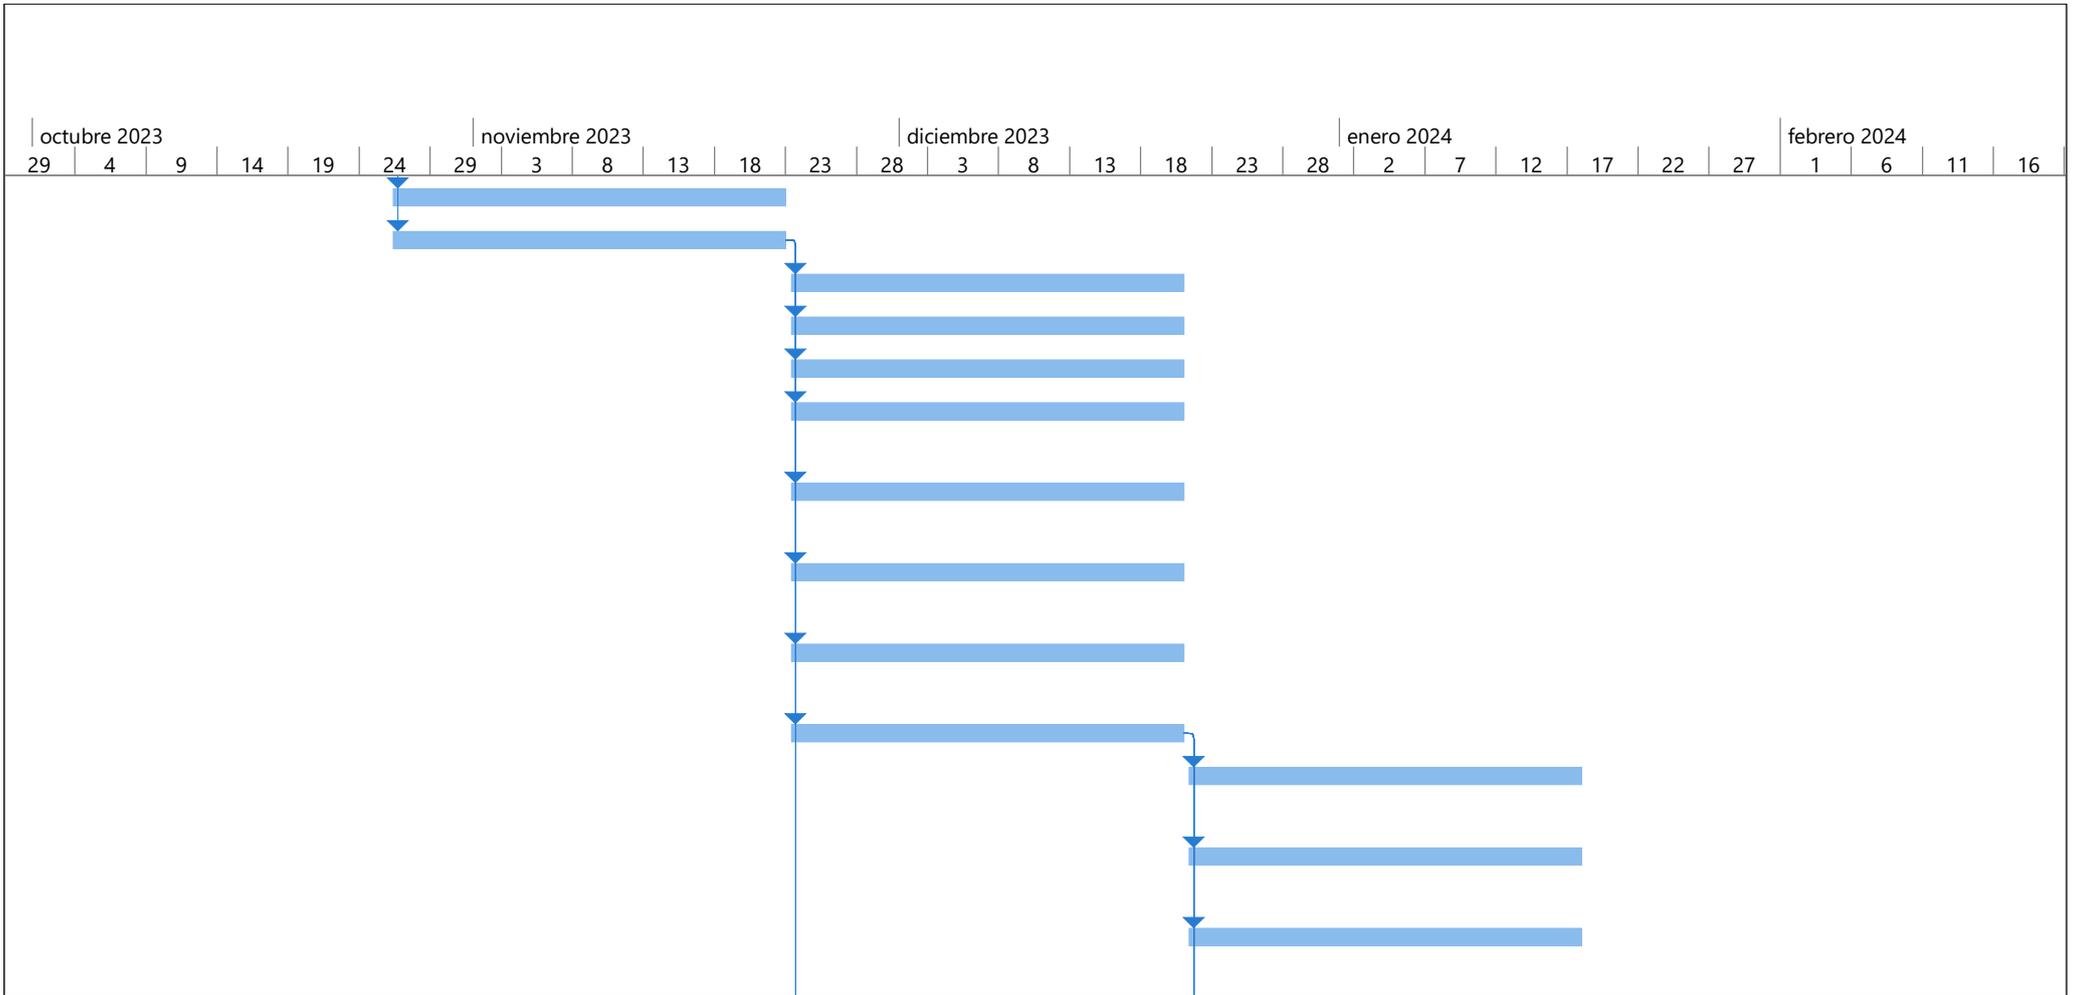


Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

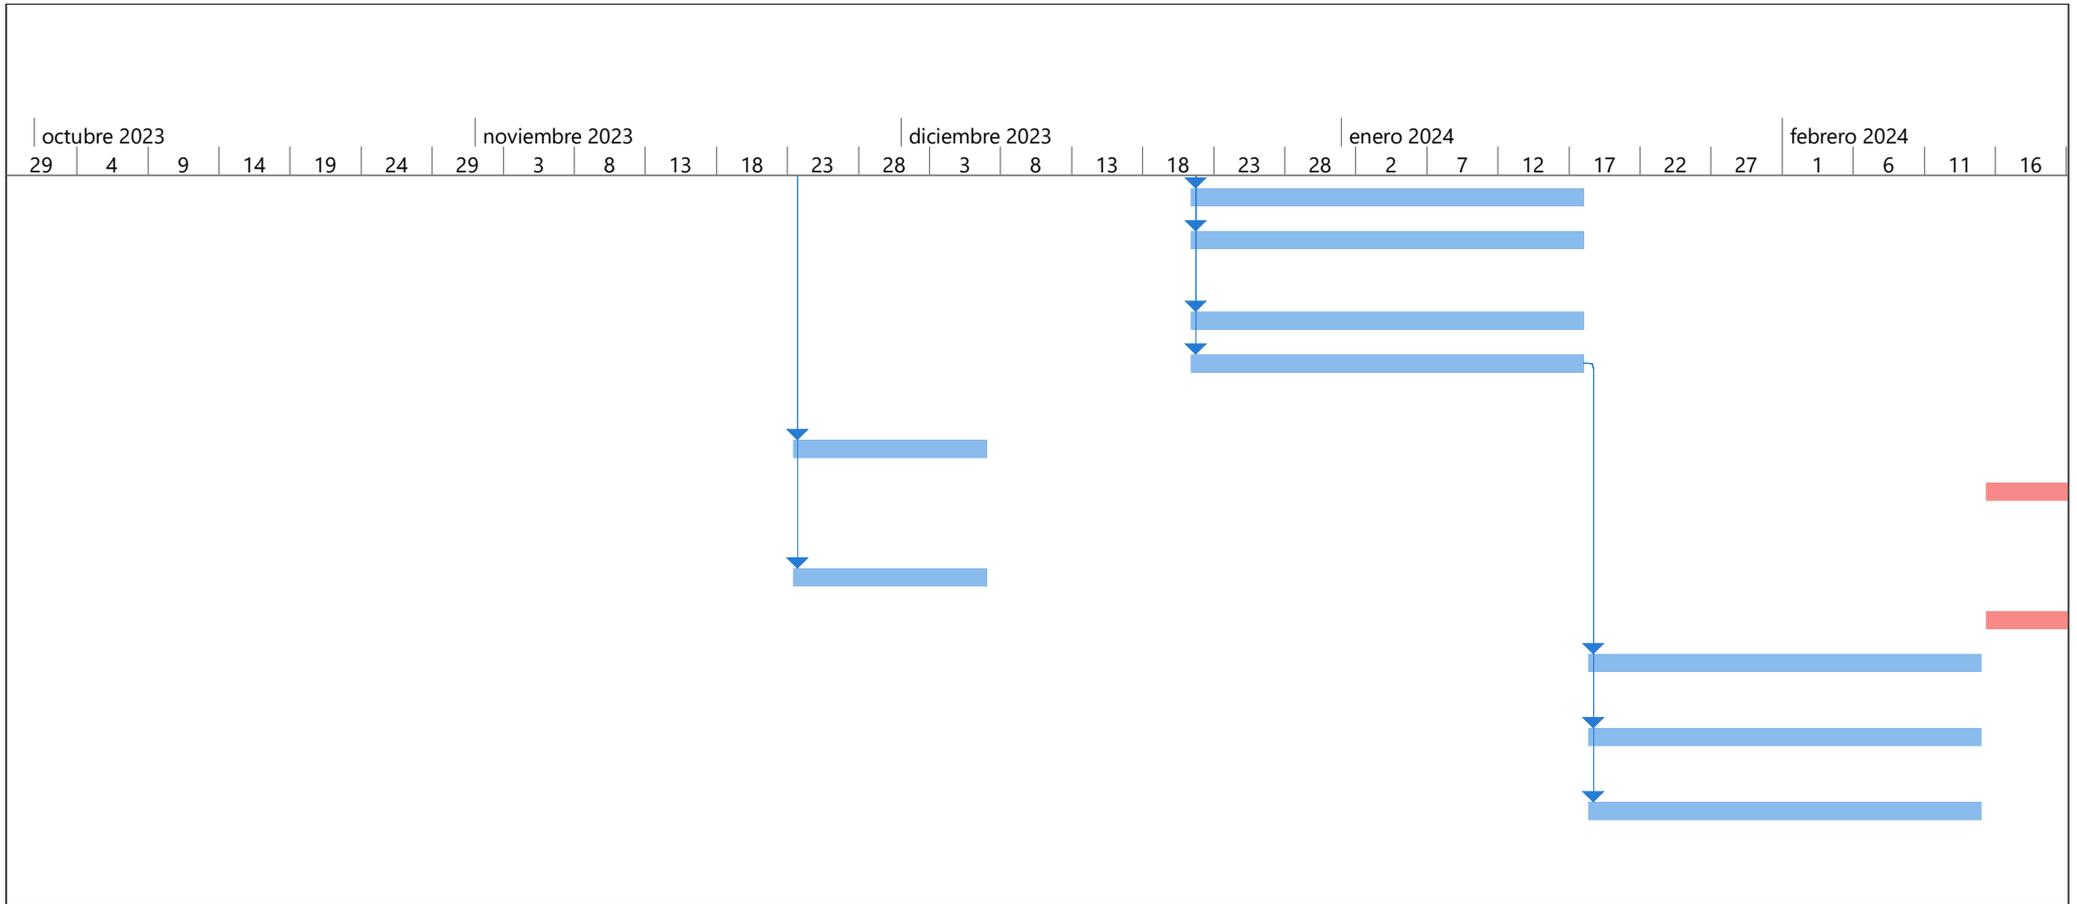

Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

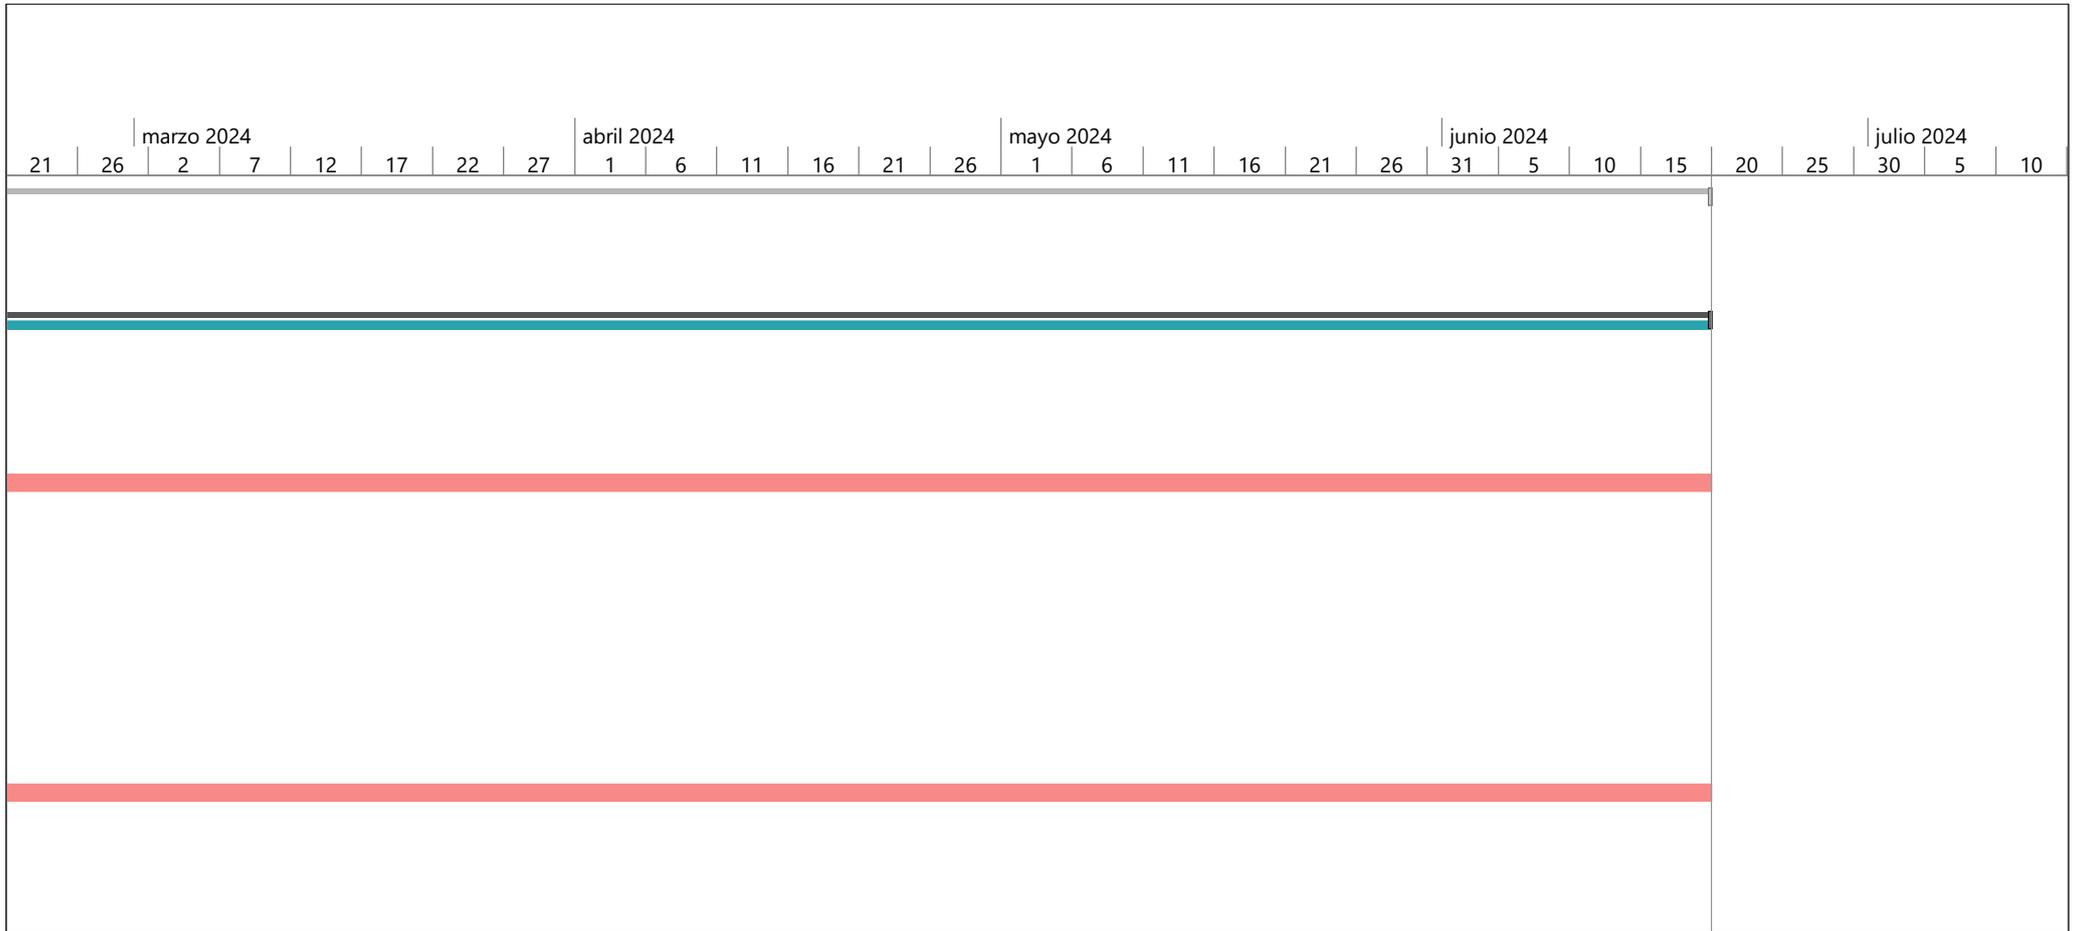


Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

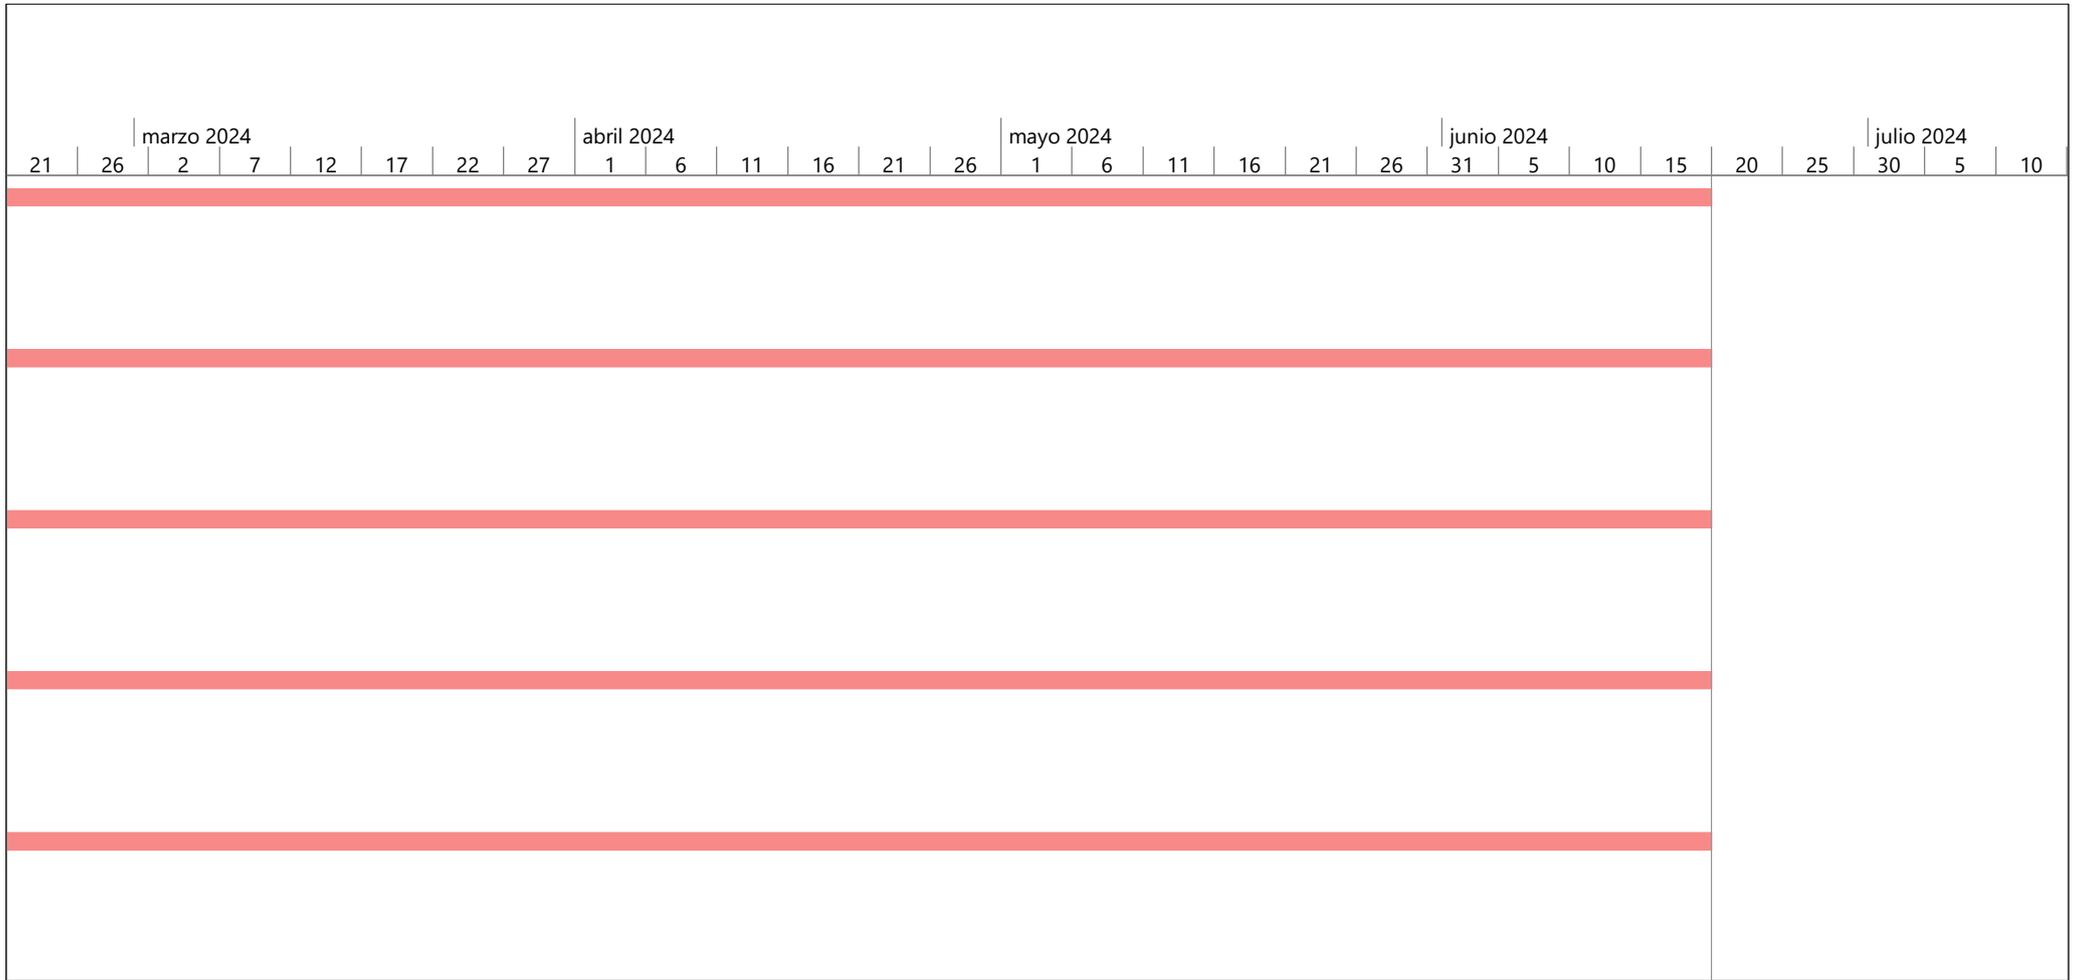

Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

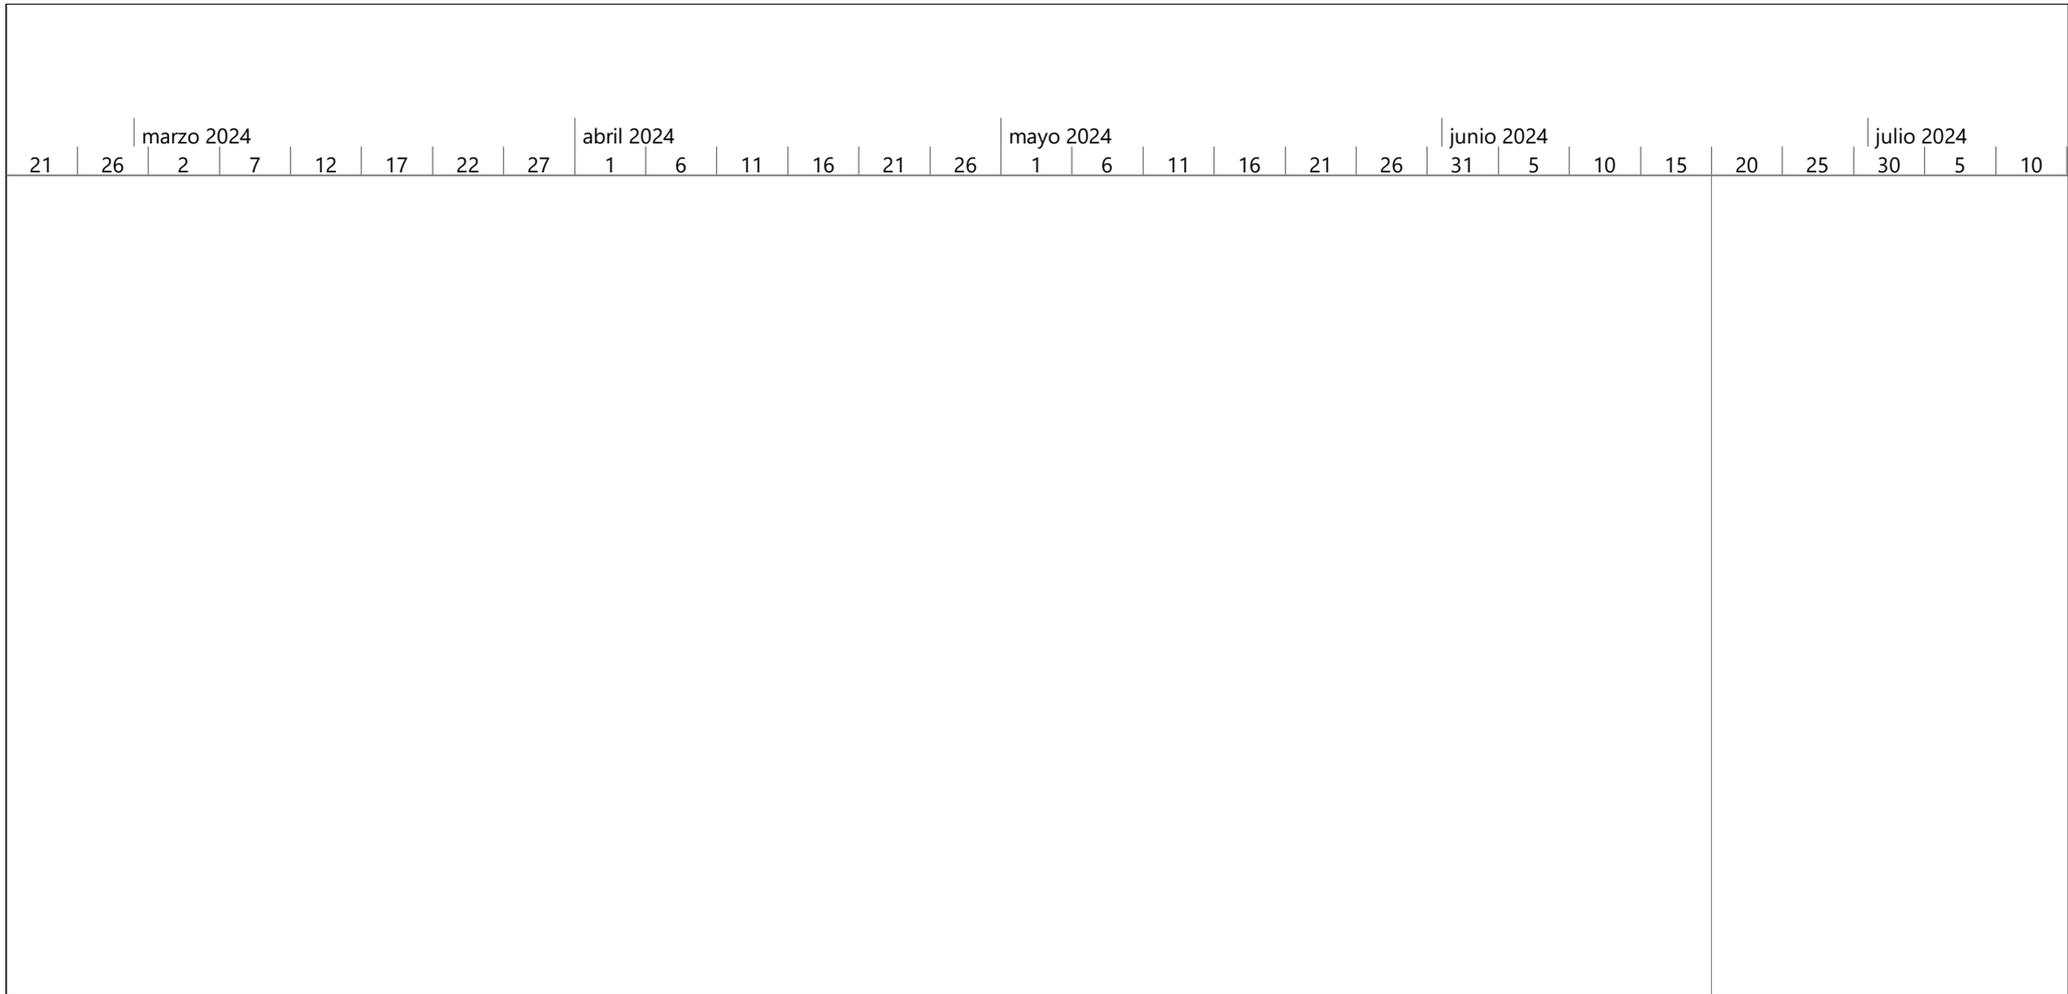

Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: CRONOGRAMA VAL Fecha: mié 30/8/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
